

MEMORANDO

Bogotá, 14 de julio de 2015

No. 71 ALOPL - 140

PARA: Señores.
Brigadier General Pablo Federico Przychodny Jaramillo, Director General
Coronel (RA) Miguel Oswaldo Valero Ortega, Director Regional Técnica de Ingenieros.
Coronel (RA) Jose Leonidas Espitia Duarte, Director Cadena de Suministros.
Ingeniero Cesar Adolfo Gonzalez Peña, Jefe Oficina de Tecnología

DE: Gabriel de la Cuesta Mora, Jefe Oficina Asesora de Planeación.

ASUNTO: Informe Avance Proyectos de Inversión Primer y Segundo Trimestre 2015.

Con base en los avances reportados por los Gerentes de Proyectos de la entidad a corte 30 JUN 2015, atentamente se envía al Señor Director General de la Agencia Logística de las FFMM, así como a los Señores Directores anteriormente relacionados, el presente informe sobre actividades realizadas y resultados alcanzados durante el primer semestre de 2015.

1. RESUMEN PROYECTOS DE INVERSION 2015

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares tiene en desarrollo tres proyectos de Inversión, relacionados a continuación:

Proyecto	Codigo BPIN	Producto	Gerente proyecto	Presupuesto producto (mill. De \$)	Presupuesto total (mill. De \$)
Implementación sistema integrado de información tipo ERP en la ALFM a nivel nacional	11000016000 00	Segunda Fase Implementación ERP	Ing. Cesar Adolfo Gonzalez Peña	4.500,0	4.500,0
Mejoramiento de la infraestructura logística y de conectividad de segundo nivel de la ALFM a nivel nacional	11000018100 00	Construir 1 Fase Sede Tolima Grande: Cerramiento(base, cimentación, muro, malla), red eléctrica, red cañerías, vías	Cr (RA) Miguel Oswaldo Valero Ortega	3.711,0	4.500,0
		Adquirir equipos de manejo de materiales para los CAD's Apiladores Eléctricos: 5 Estibadores manuales: 4 Estibador eléctrico: 1 Bateria adicional: 1 Montacargas Eléctrico: 1 Juego de estantería: 1	Cr. (RA) Jose Leonidas Espitia Duarte	589,0	
		Adquirir actualización de licencias POS CHECKOUT	Ing. Cesar Adolfo Gonzalez Peña	200,0	
Adquisición sede principal de la ALFM	20130110003 64	Adquisición Sede Principal	Cr (RA) Miguel Oswaldo Valero Ortega	32.768,0	32.768,0



A continuación se presentan las principales novedades de cada proyecto, discriminados por los productos que se esperan obtener en la vigencia 2015.

2. IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN TIPO ERP EN LA ALFM A NIVEL NACIONAL

Gerente Proyecto: Ing. Cesar Adolfo Gonzalez Peña

Item	Actividad	%	Pre y contractual	Ejecución													
			dic-14	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15		
1	Estudio Conveniencia y Oportunidad, Estudio de Mercado, Estudio Planeamiento de la obra, inicio tramitología de licencias de construcción	15%															
2	Publicación de prepliegos	15%															
3	Cierre de proceso y Contratación	20%															
4	Ejecución contrato II Etapa ERP	20%															
5	Recepción a satisfacción II Etapa ERP	15%															
6	Liquidación II etapa ERP	15%															
TOTAL		100%															

El proyecto de implementación de la segunda fase del ERP en la entidad va acorde con lo planeado en el cronograma inicial. Actualmente se desarrollaron los siguientes procesos contractuales por los valores indicados a continuación:

Inversión ERP		
Detalle	Valor (Millones de \$)	Estatus
Actualización 110 licencias más 1500 registros de HCM	265,0	Contratado
Actualización solución de almacenamiento SAN/NAS de servidor	150,0	Contratado
Actualización y crecimiento servidor blade ERP 2 fase (procesadores, memorias, drive, cintas, cuchillas y virtualización).	230,0	Publicado en portal web "proyecto pliego". En curso unidad asesora para publicación "pliego definitivo".
Implementación compras, ventas, activos fijos, financiera	3.057,0	Contratado
Interventoría compras, ventas, activos fijos, financiera	456,7	Contratado
Soporte, capacitación y nuevas funcionalidades HCM.	132,0	En estudios de mercado y estructuración estudios previos y especificaciones técnicas
TOTAL EN CURSO EJECUCIÓN		4.290,7
PRESUPUESTO ASIGNADO 2015		4.500,0
SALDO		209,3


Con base en la información antes descrita, se solicita a la Oficina de Tecnología efectuar la ejecución del saldo restante de \$209.3 millones, con el fin de alcanzar una utilización completa de los recursos asignados para este proyecto o, en su defecto, la justificación de la no utilización del mismo.

3. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA Y DE CONECTIVIDAD DE SEGUNDO NIVEL DE LA ALFM A NIVEL NACIONAL

a) Construcción I Fase Regional Tolima Grande en Piedras Gordas

Gerente de Proyecto: Coronel (RA) Miguel Oswaldo Valero Ortega

Item	Actividad	%	Precontractual		Contractual		Ejecución						Liquidación			
			dic-14	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	
1	Estudio Conveniencia y Oportunidad, Estudio de Mercado, Estudio Planeamiento de la obra, inicio tramitación de licencias de construcción	20%														
2	Publicación de prepliegos	15%														
3	Cierre de proceso y Contratación	15%														
4	Inicio ejecución contrato	15%														
5	Recepción a satisfacción elementos	20%														
6	Liquidación	15%														
TOTAL		100%														

Programado 



Ejecutado 

El proyecto presenta un retraso de dos meses de acuerdo a lo planeado, sustentado en novedades de orden legal en cuanto a la propiedad del terreno. Actualmente se encuentra en la etapa precontractual, en donde se proyecta el diseño de una bodega, el cerramiento del área, la construcción de una guardia y una vía de carril de desaceleración. Ya se efectuaron los estudios de suelos y topográficos.

b) Adquisición equipos y estantería para CAD's

Gerente Proyecto: Coronel (RA) Jose Leonidas Espitia Duarte

Item	Actividad	%	Precontractual		Contractual		Ejecución						Liquidación			
			dic-14	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	
1	Estudio Conveniencia y Oportunidad, Estudio de Mercado	20%														
2	Publicación de prepliegos	15%														
3	Cierre de proceso y Contratación	15%														
4	Inicio ejecución contrato	15%														
5	Recepción a satisfacción elementos	20%														
6	Liquidación	15%														
TOTAL		100%														



Programado 
Ejecutado 

De acuerdo a lo programado, el proyecto presenta un retraso de dos meses. La adquisición de equipos y estantería ya se encuentra en publicación de prepliegos. Se hizo el estudio previo para la adquisición del siguiente material:

- 5 Apiladores eléctricos.
- 4 Estibadores Manuales
- 1 Estibador eléctrico
- 1 Batería Adicional
- 1 Montacargas eléctrico
- 1 Juego de estantería.

c) Soporte y mantenimiento Checkout
Gerente Proyecto: Ing. Cesar Adolfo Gonzalez Peña

Ítem	Actividad	%	Precontractual		Contractual		Ejecución						Liquidación				
			dic-14	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15		oct-15	nov-15	dic-15	
1	Estudio Conveniencia y Oportunidad, Estudio de Mercado	20%															
2	Publicación de prepliegos	15%															
3	Cierre de proceso y Contratación	15%															
4	Inicio ejecución contrato	15%															
5	Recepción a satisfacción elementos	20%															
6	Liquidación	15%															
TOTAL		100%															

Programado 
Ejecutado 



De acuerdo a lo informado por la Oficina de Tecnología y producto de una nueva estrategia de negocios de la Alta Dirección para los puntos de venta, no se autorizó inversión en POS Checkout, dada la desactivación de algunas Servitiendas a nivel nacional, atendiendo las recomendaciones de la consultoría.

Por lo anterior, se solicita al Ingeniero Cesar Adolfo Gonzalez Peña, informar mediante comunicado oficial esta novedad, así como la propuesta de cambio de uso de los recursos, identificando puntualmente el cronograma de adquisición, los equipos a adquirir, la cantidad y la distribución planeada, con el fin de solicitar actualización ante el DNP y proceder al cambio de los indicadores del SUIFP.

4. ADQUISICIÓN SEDE PRINCIPAL DE LA ALFM

Gerente de Proyecto: Coronel (RA) Miguel Oswaldo Valero Ortega

Item	Actividad	%	Precontractual		Contractual		Ejecución						Liquidación			
			dic-14	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	Jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	
1	Estudio Conveniencia y Oportunidad, Estudio de Mercado, Estudio Planeamiento de la obra, inicio tramitación de licencias de construcción	15%	■	■												
2	Levantamiento Previo Concepto ante DNP	15%			■	■										
3	Cierre de proceso y Contratación	20%			■	■										
4	Inicio ejecución Adquisición Sede	25%					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Liquidación	25%														■
TOTAL		100%														

Programado 
Ejecutado 

El proyecto de adquisición de la sede ha presentado demoras en su ejecución, toda vez que hasta el 19 JUN 2015 se formalizó el Decreto No. 1340, a través del cual se desplazó el presupuesto para la adquisición de la sede (mismo que se encontraba aplazado de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 377 del 04 MAR 2015). Una vez se contó con este documento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Oficina Asesora de Planeación procedió a programar una reunión con el Departamento Nacional de Planeación, para solicitar el levantamiento del previo concepto.

El 23 JUN 2015, el Director General junto con el grupo de la Oficina Asesora de Planeación, realizaron la presentación del predio seleccionado de acuerdo al estudio de mercado, el cual está ubicado en la CII 95 #13-08 (Proyecto Trece Oficinas).

Resultado de esa reunión, el DNP autorizó el levantamiento del previo concepto, lo que permitió a la ALFM generar el CDP No. 34615 del 01 JUL 2015 por el valor total del proyecto.

5. DISPOSICIONES FINALES

- Se recuerda a los señores Gerentes de Proyectos que todas las actividades reportadas durante el año deben contar con su respectivo soporte, que justifique ante los organismos de control el cumplimiento y el avance dado a lo largo de la vigencia.
- Se Solicita a los señores Gerentes de Proyectos mantener actualizada la información respecto a los avances de cada actividad, toda vez que las evaluaciones y ponderaciones se hacen con base en la última información disponible.



- Para aquellas tareas que no lograron el avance esperado, los Gerentes de Proyectos debe remitir a la Oficina Asesora de Planeación, las razones por las cuales no se cumplieron de acuerdo a lo programado, que sirvan de sustento explicativo ante los organismos de control.

Atentamente,



GABRIEL DE LA CUESTA MORA
Jefe Oficina Asesora de Planeación


ANEXO: Reporte DNP SPI – Proyecto ERP, Proyecto Modernización Infraestructura y Proyecto Adquisición Sede



Elaboró: Miguel Angel Arévalo Luque
Asesor Oficina de Planeación

Nombre del proyecto

IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION TIPO ERP EN LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL

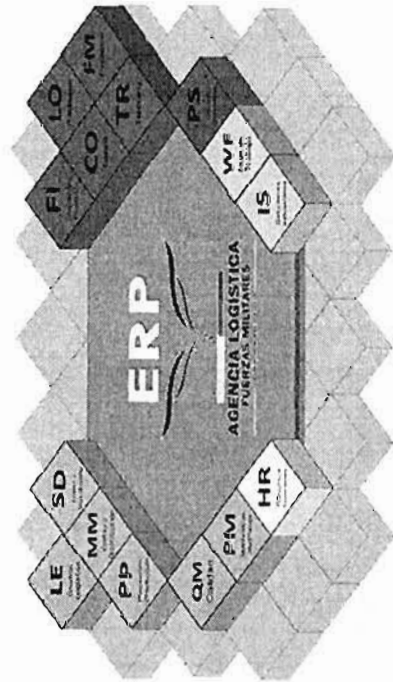


Objetivo general:

IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA (SOFTWARE, HARDWARE Y CONECTIVIDAD) PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, A TRAVÉS DE LA CUAL SE FORTALEZCA E INCREMENTE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS INTERNOS EN BENEFICIO DEL APOYO LOGÍSTICO HACIA LAS FUERZAS MILITARES SE PRETENDE ADQUIRIR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION QUE SOPORTE LOS PROCESOS FINANCIEROS, LOGÍSTICOS Y ADMINISTRATIVOS A TRAVÉS DE LOS MÓDULOS: CONTABILIDAD PRESUPUESTO, TESORERÍA, CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR, INVENTARIOS Y SUMINISTROS, ACTIVOS FIJOS, CONTRATACIÓN, RECURSO HUMANO, GESTIÓN DE CRÉDITOS Y GESTIÓN DE CARTERA, ENTRE OTROS, IGUALMENTE SE ADQUIRIRÁN EQUIPOS SERVIDORES Y EQUIPOS-CLIENTE DE ALTA CONFIGURACIÓN QUE PERMITAN SOPORTAR EL SOFTWARE DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED PRIVADA VIRTUAL MEDIANTE ENLACES DE DISCADOS QUE PERMITA CONCETAR LAS REGIONALES CON LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA, FACILITANDO DE ESTA MANERA EL INTERCAMBIO DE DATOS Y LA OPERACIÓN EN LÍNEA SOBRE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA.

Código BPIN: 1100001600000
 Sector: Defensa Y Policía
 Entidad: Agencia Logística Fimmi
 Responsable: Miguel Angel Arévalo Luque
 Horizonte: 2007 - 2016
 Presupuesto 2015: \$ 4.500.000.000
 Control Posterior: 26/05/2015
 Seguimiento de: junio 2015

PND: Pendiente
 Pilar: Consolidación de la paz
 Objetivo: Seguridad – orden público y seguridad ciudadana
 Estrategia: Sin estrategia
 Programa: Logística

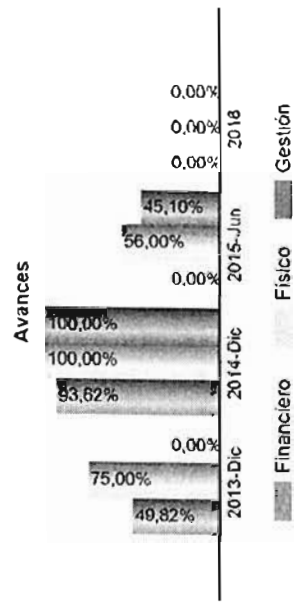

SPI detalle de proyecto

Julio 17, 2015 10:04 a.m.

Proyecto: MANTENCIÓN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN TIPO ERP EN LA AGENCIA UCRISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL - 110000780000

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Unificar en una sola plataforma tecnológica (Software) los diferentes sistemas actuales en la entidad

PRODUCTOS

Sistema de Información Tipo ERP

Indicador	Meta Total 2007-2016	Acumulado 2007-2014	Meta 2015	Avance 2015	Cumplimiento 2015
Sistema de Información Tipo ERP Implementado A NIVEL NACIONAL - Unidad de Medida: Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Actividad			Inicial	Vigente	Obligado
Asegurar la calidad de la implementación (FASE II - 2014)			\$0	\$0	\$0
TOTAL			\$0	\$0	\$0

Sistema Integrado de Información Tipo ERP (FASE III)

Indicador	Meta Total 2007-2016	Acumulado 2007-2014	Meta 2015	Avance 2015	Cumplimiento 2015
Sistema Integrado de Información Tipo ERP (FASE II) Implementado a nivel nacional - Unidad de Medida: Porcentaje	100,00	10,00	00,00	00,00	05,58 %
Actividad			Inicial	Vigente	Obligado
Levantamiento detallado de procesos BPR-Business Blueprint (FASE II - 2014)			\$0	\$0	\$0
Realizar la parametrización de los procesos y funcionalidades (FASE II - 2014)			\$0	\$0	\$0
Iniciar operación en vivo (FASE II - 2014)			\$3.375.000.000	\$3.375.000.000	\$0
Asegurar la calidad de la implementación (FASE II - 2014)			\$915.750.000	\$915.750.000	\$0
Adquirir/Renovar Licencias SAP para implementación ERP - FASE II			\$209.250.000	\$209.250.000	\$0
TOTAL			\$4.500.000.000	\$4.500.000.000	\$0

Sistema Integrado de Información Tipo ERP (FASE III)

Indicador	Meta Total 2007-2016	Acumulado 2007-2014	Meta 2015	Avance 2015	Cumplimiento 2015
Sistema Integrado de Información Tipo ERP (FASE III) Implementado a nivel nacional - Unidad de Medida: Porcentaje	100,00	0,00	10,00	0,00	0,00 %

Proyecto: IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION TIPO ERP EN LA AGROPECUARIO LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL - 11003160000

PRODUCTOS

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Planear y elaborar estudios previos para la implementación (FASE III)	PGN	\$0	\$0	\$0
Gestionar Vigencia Futura y Realizar proceso Licitatorio para la implementación FASE III y Aseguramiento de la Calidad	PGN	\$0	\$0	\$0
Diseñar y Preparar estrategias para el desarrollo del proceso de implementación (Preparación Inicial) (FASE III)	PGN	\$0	\$0	\$0
Asegurar la calidad de la implementación (FASE III)	PGN	\$0	\$0	\$0
Adquirir/Renovar Licencias SAP para implementación ERP - FASE III	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$0	\$0	\$0

Fortalecer la infraestructura tecnológica (Hardware) existente.

PRODUCTOS

Indicador	Meta Total 2007-2016	Acumulado 2007-2014	Meta 2015	Avance 2015	Cumplimiento 2015
Procesamiento de información	100.00	20.00	70.00	0.00	0.00 %
- Unidad de Medida: Porcentaje					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Adquirir equipos de cómputo	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$0	\$0	\$0	

> Esquema Financiero

>> Resumen Financiero 2007 - 2016

Fuente: **SUIFP - *SIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Cifras en Pesos Corrientes

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2008-Dic	1.677.000.000	1.677.000.000	1.677.000.000	1.624.943.485	1.378.746.313	716.247.419	Financiero 82,22% Físico 35,00% Gestión 50,00%
2009-Dic	1.276.000.000	1.276.000.000	1.276.000.000	1.237.529.444	1.084.764.776	706.521.494	Financiero 85,01% Físico 17,00% Gestión 16,50%

SPI detalle de proyecto

Julio 17, 2015 10:04 a.m.

Proyecto: IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION TIPO ERP EN LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL - 11005789900

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2010-Dic	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	908.144.202	630.939.161	421.722.278	Financiero: 31,57% Físico: 100,00% Gestión: 50,00%
2011-Dic	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0	0	Financiero: 0,00% Físico: 0,00% Gestión: 0,00%
2012-Dic	2.500.000.000	4.100.000.000	500.000.000	0	0	0	Financiero: 0,00% Físico: 0,00% Gestión: 0,00%
2013-Dic	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	2.241.789.777	2.241.789.777	506.228.682	Financiero: 49,82% Físico: 75,80% Gestión: 0,00%
2014-Dic	7.894.860.000	4.161.200.000	4.161.200.000	3.895.687.262	3.895.687.262	1.777.897.082	Financiero: 93,62% Físico: 100,00% Gestión: 100,00%
2015-Jun	5.000.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	3.916.364.635	0	0	Financiero: 0,00% Físico: 0,00% Gestión: 45,10%
2016	3.500.000.000	0	0	0	0	0	Financiero: 0,00% Físico: 0,00% Gestión: 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIF (30/06/2015)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Ptal.
Recursos Propios	4.500.000.000	4.500.000.000	3.916.364.635	0	0	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	4.500.000.000	4.500.000.000	3.916.364.635	0	0	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	4.500.000.000	4.500.000.000	3.916.364.635	0	0	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2015

SPI detalle de proyecto

julio, 17, 2015 10:04 a.m.

Proyecto: IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION TIPO ERP EN LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL - 1100001500000

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	33,00 %	33,00 %	33,00 %	33,00 %	56,00 %	56,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestión	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	45,10 %	45,10 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Recursos Propios	209.250.000	209.250.000	0	0	0
	Infraestructura/hardware	Recursos Propios	0	0	0	0	0
	Servicios	Recursos Propios	4.290.750.000	4.290.750.000	3.778.712.389	0	0
Total			4.500.000.000	4.500.000.000	3.778.712.389	0	0

> Metas de Producto (BIS)

OBJETIVO ESPECIFICO

Unificar en una sola plataforma tecnológica (Software) los diferentes sistemas actuales en la entidad

PRODUCTOS

Sistema de Información Tipo ERP

Indicador BIS

	% Peso 2015	Meta Total 2007-2016	Acumulado 2007-2014	Meta 2015	Avance 2015	Meta Rezagada 2014	Avance Rezago 2015	Cumplimiento 2015
Usuarios Atendidos	50,00 %	500,00	78,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Modulos Implementados Del Sistema De Información	50,00 %	4,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

SPI detalle de proyecto

Julio 17, 2015 10:04 a.m.

Proyecto: IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION TIPO ERP EN LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL - 110001600040

OBJETIVO ESPECIFICO

Fortalecer la infraestructura Tecnológica (Hardware) ex stenta

PRODUCTOS

Procesamiento de información

Indicador BIS	% Peso 2015	Meta Total 2007-2016	Acumulado 2007-2014	Meta 2015	Avance 2015	Meta Rezagada 2014	Avance Rezago 2015	Cumplimiento 2015
Equipos Adquiridos	100.00 %	500.00	78.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %

> **Metas de Gestión**

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Avance Plan De Accion	78	50.00	71.43 %

Observaciones: MAYO: Se contrato la "IMPLEMENTACION E INTERVENTORIA DE COMPRAS, VENTAS, ACTIVOS FIJOS, FINANCIERAS"

Modulos Del Sistema De Informacion Integrados	2	0.00	0.00 %
Licencias Adquiridas	272	110.00	40.44 %

Observaciones: MAYO: Se adquirieron 110 licencias

Contratos suscritos	4	3.00	75.00 %
---------------------	---	------	---------

Observaciones: MAYO: Se contrato la actualización de licencias, la implementación de la FASE II y la Interventoria a esta

> **Regionalización**

Cifras en Pesos Corrientes

>> **Resumen Regional**

	Por Regionalizar	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquia	Amazonia	Bogotá D.C.
Inversión	0	135.216.000	78.376.000	194.373.000	78.876.000	64.791.000	3.947.868.000
Avance Financiero	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Avance Físico	0.00 %	66.67 %	59.00 %	16.67 %	0.00 %	0.00 %	50.00 %

SPI detalle de proyecto

Julio, 17, 2015 10:04 a.m.

Proyecto: IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION TIPO ERP EN LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL - 1120001600000

>> Regionalización de Recursos

Fuente financiación / Departamento	Inicial	Vigente	Compromisos	Obligación	Pago
Recursos Propios	4.500.000.000	4.500.000.000	3.916.364.635	0	0
---Antioquia	56.340.000	50.706.000	0	0	0
---Atlántico	65.730.000	59.157.000	0	0	0
---Bogotá	3.888.520.000	3.947.868.000	3.916.364.635	0	0
---Bolívar	21.910.000	19.719.000	0	0	0
---Cauquetá	56.340.000	50.706.000	0	0	0
---Cundinamarca	150.240.000	135.216.000	0	0	0
---Meta	87.640.000	78.875.000	0	0	0
---Santander	65.730.000	59.157.000	0	0	0
---Valle	93.900.000	84.510.000	0	0	0
---Putumayo	15.650.000	14.085.000	0	0	0
TOTAL	9.000.000.000	9.000.000.000	7.832.729.270	0	0

>> Regionalización de Productos

OBJETIVO ESPECIFICO

Unificar en una sola plataforma tecnológica (Software) los diferentes sistemas actuales en la entidad

Indicador / Departamento	Meta Programada	Meta 2015	Avance 2015	Cumplimiento 2015
0900P015 - Usuarios Atendidos (Número)	272,00	272,00	0,00	0,00%
---Antioquia	23,00	23,00	0,00	0,00%
---Atlántico	26,00	26,00	0,00	0,00%
---Bogotá	36,00	36,00	0,00	0,00%
---Bolívar	12,00	12,00	0,00	0,00%
---Cauquetá	18,00	18,00	0,00	0,00%
---Cundinamarca	58,00	58,00	0,00	0,00%
---Meta	33,00	33,00	0,00	0,00%
---Santander	26,00	26,00	0,00	0,00%
---Valle	35,00	35,00	0,00	0,00%
---Putumayo	5,00	5,00	0,00	0,00%

Proyecto: IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION TIPO ERP EN LA AGENCIA SOCIOLOGICA DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL - 1100001600000

OBJETIVO ESPECIFICO

Unificar en una sola plataforma tecnológica (Software) los diferentes sistemas actuales en la entidad.

Indicador / Departamento	Meta Programada	Meta 2015	Avance 2015	Cumplimiento 2015
Sistema Integrado de Información Tipo ERP (FASE II) Implementado a nivel nacional (Número)	90.00	90.00	30.00	33.00%
---Antioquia	5.00	5.00	6.00	100.00%
---Atlántico	6.00	6.00	6.00	100.00%
---Bogotá	24.00	24.00	12.00	50.00%
---Bolívar	6.00	6.00	0.00	0.00%
---Caquetá	6.00	6.00	0.00	0.00%
---Cundinamarca	12.00	12.00	6.00	50.00%
---Meta	6.00	6.00	0.00	0.00%
---Santander	6.00	6.00	0.00	0.00%
---Valle	12.00	12.00	0.00	0.00%
---Putumayo	6.00	6.00	0.00	0.00%

Unificar en una sola plataforma tecnológica (Software) los diferentes sistemas actuales en la entidad.

Indicador / Departamento	Meta Programada	Meta 2015	Avance 2015	Cumplimiento 2015
Sistema Integrado de Información Tipo ERP (FASE III) Implementado a nivel nacional (Número)	10.00	10.00	0.00	0.00%
---Bogotá	10.00	10.00	0.00	0.00%
Fortalecer la infraestructura tecnológica (Hardware) existente				
Indicador / Departamento	Meta Programada	Meta 2015	Avance 2015	Cumplimiento 2015
1100P020 - Equipos Adquiridos (Número)	272.00	272.00	0.00	0.00%
---Antioquia	23.00	23.00	0.00	0.00%
---Atlántico	26.00	26.00	0.00	0.00%
---Bogotá	36.00	36.00	0.00	0.00%
---Bolívar	12.00	12.00	0.00	0.00%
---Caquetá	18.00	18.00	0.00	0.00%
---Cundinamarca	48.00	48.00	2.00	0.00%
---Meta	34.00	33.00	0.00	0.00%
---Santander	26.00	26.00	0.00	0.00%
---Valle	35.00	35.00	0.00	0.00%
---Putumayo	5.00	5.00	0.00	0.00%


Proyecto:

IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION TIPO ERP EN LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL - 1100001300000



Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOGISTICA Y DE CONECTIVIDAD DE SEGUNDO NIVEL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM A NIVEL NACIONAL

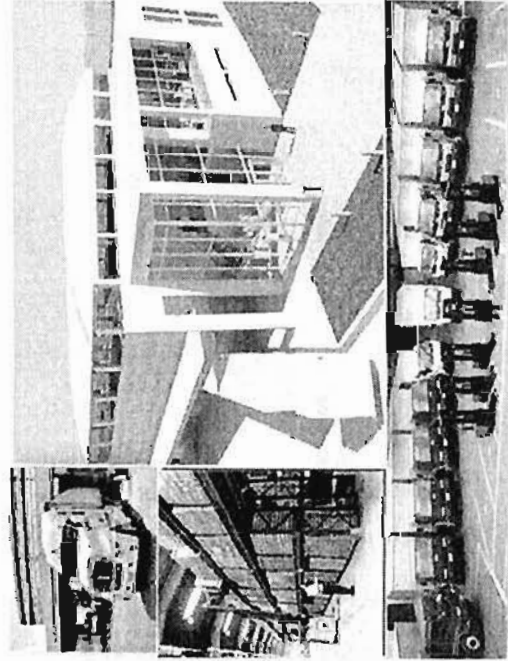

Objetivo general:

MEJORAR LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA AGENCIA LOGISTICA A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOGISTICA (INSTALACIONES FÍSICAS, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, TECNOLOGÍA, CONECTIVIDAD Y EQUIPOS PARA MANEJO DE MATERIALES) DE CADA UNO DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS. SE ELABORARÁ UN MAESTRO ÚNICO DE PRODUCTOS BASADO EN ESTÁNDARES INTERNACIONALES QUE UNIDO A LA ADOPCIÓN DEL CÓDIGO DE BARRAS Y EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EXISTENTE OPTIMIZARÁN EL REGISTRO AUTOMÁTICO, LA TRAZABILIDAD Y LOS PROCESOS DE CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO. SE MEJORARÁ LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ELEMENTOS PERIFÉRICOS COMO LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS, PATCH PANEL, QUE COMPLEMENTARÁN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EXISTENTE Y OPTIMIZARÁN LA CAPTURA DE DATOS EN LOS PROCESOS DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPOS DE OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE ABASTECIMIENTO Y UNIDADES DE NEGOCIO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BODEGAS, EQUIPOS DE MANEJO DE MATERIALES, ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN DE ABASTECIMIENTOS CLASE II A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PARA LAS REGIONALES.

Código BPIN: 1100001810000

Sector: Defensa Y Policía

Entidad: Agencia Logista Ffmm

Responsable: Miguel Angel Arevalo Luque

Horizonte: 2008 - 2016

Presupuesto 2015: \$ 4.500.000.000

Control Posterior: 26/05/2015

Seguimiento de: junio 2015


PND: Pendiente

Pilar: Consolidación de la paz

Objetivo: Seguridad - orden público y seguridad ciudadana

Estrategia: Sin estrategia

Programa: Logística

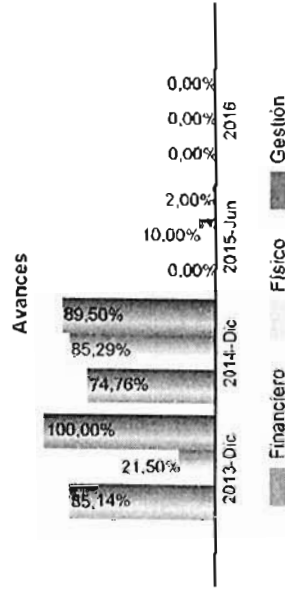

SPI detalle de proyecto

Julio, 17, 2015 10:05 a.m.

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA Y DE CONECTIVIDAD DE SEGURIDAD NIVEL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF.AA. A NIVEL NACIONAL - 1103001810000

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Fortalecer la cadena de distribución de los abastecimientos Clase I y Clase III a través de adquisición equipos de transporte y suministro para

PRODUCTOS

Servicios transporte y suministro de combustible aéreo

Indicador	Meta Total 2008-2016	Acumulado 2008-2014	Meta 2015	Avance 2015	Cumplimiento 2015
Servicios transporte y suministro de combustible aéreo implementado para el almacenamiento y suministro de combustible aéreo - Unidad de Medida: Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %

Servicio de transporte de viveres frescos, secos y de comida caliente a campo

Indicador	Meta Total 2008-2016	Acumulado 2008-2014	Meta 2015	Avance 2015	Cumplimiento 2015
Servicio de transporte de viveres frescos, secos y de comida caliente a campo Implementado - Unidad de Medida: Porcentaje	100.00	3.00	43.00	0.00	0.00 %
Actividad			Inicial	Vigente	Obligado
Planear la adquisición de vehículos para transporte de viveres frescos, secos y/o transporte comida caliente		PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar proceso de adquisición de vehículos para transporte de viveres frescos, secos y/o transporte comida caliente		PGN	\$6	\$0	\$0
Recepción a satisfacción de Vehículos para transporte de viveres secos		PGN	\$0	\$0	\$0
Recepción a satisfacción de Vehículos refrigerados para transporte de viveres frescos		PGN	\$6	\$0	\$0
Recepción a satisfacción de vehículos Azafates para transporte de transporte comida caliente a campo		PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL			\$0	\$0	\$0

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOGISTICA Y DE CONECTIVIDAD DE SEGURO NIVEL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM A NIVEL NACIONAL - 1109041810000

OBJETIVO ESPECIFICO

Mejorar la infraestructura tecnológica del proceso de abastecimiento Clase I a través de la adquisición y/o actualización del Sistema POS y sus componentes

PRODUCTOS

Sistema de información POS

Indicador	Meta Total 2008-2016	Acumulado 2008-2014	Meta 2015	Avance 2015	Cumplimiento 2015
Sistema de información POS Actualizado - Unidad de Medida: Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Observaciones : MAYO: En ajuste Estudios Previos. Ya se cuenta con Estudio de Mercado y se están ajustando documentos para solicitud CDP y apertura proceso contractual.

Añadir y dotar la infraestructura física disponible para los procesos de abastecimientos Clase I y Clase II

PRODUCTOS

Centros de Abastecimiento y Distribución

Indicador	Meta Total 2008-2016	Acumulado 2008-2014	Meta 2015	Avance 2015	Cumplimiento 2015
Centros de Abastecimiento y Distribución Construidos y Dotados - Unidad de Medida: Unidad	3,00	1,50	1,00	0,10	10,00 %

Observaciones : MAYO: Se inició el proceso de contratación de estudios estructurales

Actividad

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Construir el CAD Tipo I en Tolemaida	PGN	\$3.711.000.000	\$3.711.000.000	\$0
Construir el CAD Tipo II en la Guajira	PGN	\$0	\$0	\$0
Adquirir equipos de manejo de materiales para los CAD s (Montacargas, Elevadores, Apiladores)	PGN	\$789.000.000	\$789.000.000	\$0
Ampliación Sede Llanos Orientales	PGN	\$0	\$0	\$0
Elaborar estudios previos y diseños de los CAD s y Estudios de equipos a adquirir	PGN	\$0	\$0	\$0
Adquisición equipos de refrigeración y congelación	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$4.500.000.000	\$4.500.000.000	\$0

SPI detalle de proyecto

Julio 17, 2015 10:05 a.m.

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOGISTICA Y DE CONECTIVIDAD DE SEGURIDAD AMBIENTAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FEMSA NIVEL NACIONAL - 1100001810000

Fuente: *SUJFP - *SIIF, Información va desde 2008 año que se inició el SPI

>> Resumen Financiero 2008 - 2016

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2008-Dic	3.275.000.000	3.275.000.000	3.275.000.000	2.963.171.581	2.812.280.421	1.144.939.396	Financiero 85,87% Físico 0,00% Gestión 1,00%
2009-Dic	4.328.000.000	4.328.000.000	4.328.000.000	4.296.378.537	3.954.311.721	2.656.491.826	Financiero 91,37% Físico 47,00% Gestión 33,00%
2010-Dic	5.934.000.000	5.934.000.000	5.934.000.000	5.529.864.676	5.459.364.961	5.067.488.134	Financiero 52,68% Físico 100,00% Gestión 0,00%
2011-Dic	4.600.000.000	2.600.000.000	2.600.000.000	352.141.496	352.141.496	349.104.980	Financiero 13,54% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2012-Dic	4.600.000.000	2.835.000.000	2.835.000.000	2.819.339.440	2.019.559.863	457.383.444	Financiero 71,24% Físico 51,70% Gestión 100,00%
2013-Dic	2.000.000.000	3.300.000.000	3.300.000.000	3.201.905.639	2.809.702.648	1.303.352.800	Financiero 85,14% Físico 21,50% Gestión 100,00%
2014-Dic	8.411.000.000	8.411.000.000	8.411.000.000	7.593.825.922	6.287.802.786	4.691.092.572	Financiero 74,76% Físico 85,00% Gestión 89,50%
2015-Jun	6.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 10,00% Gestión 2,00%
2016	5.170.400.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/06/2015)

Recursos Propios	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Ptal.
4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	0	0	0	Apr. Vigente 1.306.023.736,00 Pago 118.244.578,00

SPI detalle de proyecto

Julio, 17, 2015 10:05 a.m.

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA Y DE CONECTIVIDAD DE SEGUNDO NIVEL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF.MM.A NIVEL NACIONAL - 11000261810009

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Total PGN	4.500.000.000	4.500.000.000	0	0	0	Apr. Vigente 1.306.023.136,00 Pago 118.244.978,00
Total	4.500.000.000	4.500.000.000	0	0	0	Apr. Vigente 1.306.023.136,00 Pago 118.244.978,00

>> Evolución 2015

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	10,00 %	10,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestión	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2,00 %	2,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Avalúos Contratados Para La Adquisición De Predios Y/o Mejoras	1	0,10	10,00 %
Observaciones: MAYO: Se inició el proceso contractual para la elaboración de estudios estructurales			
Contratos De Obra Física Celebrados	1	0,00	0,00 %

> Regionalización

>> Resumen Regional

Cifras en Pesos Corrientes



SPI detalle de proyecto

Julio, 17, 2015 10:05 a.m.

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOGISTICA Y DE CONECTIVIDAD DE SEGURIDAD NIVEL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM A NIVEL NACIONAL - 1100010810000

	Por Regionalizar	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquia	Amazonia	Bogotá D.C.
Inversión	0	718.200.000	0	2.454.700.000	0	359.100.000	968.000.000
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,80 %

>> Regionalización de Recursos

Fuente financiación / Departamento	Inicial	Vigente	Compromisos	Obligación	Pago
Recursos Propios	4.500.000.000	4.500.000.000	0	0	0
--Bogota	968.000.000	968.000.000	0	0	0
--Cariquetá	359.100.000	359.100.000	0	0	0
--Cauca	359.100.000	359.100.000	0	0	0
---Cundinamarca	2.095.600.000	2.095.600.000	0	0	0
---Santander	359.100.000	359.100.000	0	0	0
--Valle	359.100.000	359.100.000	0	0	0
TOTAL	9.000.000.000	9.000.000.000	0	0	0

>> Regionalización de Productos

OBJETIVO ESPECIFICO

Nombre del proyecto:

ADQUISICIÓN SEDE PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF.MM , , BOGOTÁ



Objetivo general:

PROVEER DE UNAS INSTALACIONES FÍSICAS ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES QUE SE DESARROLLAN EN LAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE PRINCIPAL

Código BPIN: 2013011000364

Sector: Defensa Y Policía

Entidad: Agencia Logista Ffmm

Responsable: Miguel Angel Arévalo Luque

Horizonte: 2014 - 2016

Presupuesto 2015: \$ 32.768.000,000

Control Posterior: 23/06/2015

Seguimiento de: junio 2015

PND: Pendiente


Pilar: Consolidación de la paz

Objetivo: Seguridad - orden público y seguridad ciudadana

Estrategia: Sin estrategia

Programa: Seguridad y defensa nacional

Avances



■ Financiero ■ Físico ■ Gestión

SPI detalle de proyecto

Julio, 17, 2015 10:06 a.m.

Proyecto: **ADQUISICION SEDE PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM., BOGOTA - 2013011000364**

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Obtener instalaciones para el funcionamiento de las dependencias de la Sede Principal

PRODUCTOS

Sede

Indicador	Meta Total 2014-2016	Acumulado 2014-2014	Meta 2015	Avance 2015	Cumplimiento 2015
Sede Adquirida para el funcionamiento de las dependencias de la Oficina Principal de la entidad - Unidad de Medida: Unidad	1,00	0,00	1,00	0,45	45,00 %

Observaciones : JUNIO: Con Decreto 1340 del 19 JUN 2015 el MHCP autorizó desplazamiento del presupuesto de inversión para adquisición de la sede. El 01 JUL 2015 se elaboró el CDP No 34015 por \$32.768,0 millones para adquirir el nuevo edificio.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Efectuar estudios de mercado	PGN	\$0	\$0	\$0
Analizar opciones y seleccionar el inmueble a adquirir	PGN	\$0	\$0	\$0
Planear la adquisición del inmueble	PGN	\$0	\$0	\$0
Adquirir el inmueble	PGN	\$28.500.000,000	\$28.500.000,000	\$0
Efectuar seguimiento y recibir a satisfacción el inmueble	PGN	\$0	\$0	\$0
Adquirir dotación del inmueble	PGN	\$4.268.000,000	\$4.268.000,000	\$0
TOTAL	PGN	\$32.768.000,000	\$32.768.000,000	\$0

Área de oficina

Indicador	Meta Total 2014-2016	Acumulado 2014-2014	Meta 2015	Avance 2015	Cumplimiento 2015
Área de oficina Dotada para los funcionarios de la entidad - Unidad de Medida: Metro cuadrado	3.200,00	0,00	3.200,00	0,10	0,00 %

Observaciones : MAYO: Se presentó ante consejo directivo la propuesta de adquisición de la sede. Se gestionó ante MHCP el Desplazamiento del Presupuesto

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Efectuar estudios de mercado	PGN	\$0	\$0	\$0
Analizar opciones y seleccionar el inmueble a adquirir	PGN	\$0	\$0	\$0
Planear la adquisición del inmueble	PGN	\$0	\$0	\$0
Adquirir el inmueble	PGN	\$0	\$0	\$0
Recibir a satisfacción el inmueble	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL	PGN	\$0	\$0	\$0

Ambiente laboral

SPI detalle de proyecto

Julio, 17, 2015 10:06 a.m.

Proyecto: ADQUISICION SEDE PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM., BOGOTA - 2013011000364

PRODUCTOS

Indicador	Meta Total 2014-2016	Acumulado 2014-2014	Meta 2015	Avance 2015	Cumplimiento 2015
Ambiente laboral adecuado para los funcionarios de la entidad - Unidad de Medida: Porcentaje	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Recibir a satisfacción y pago	PGN	\$0	\$0	\$0	\$0
Identificar las necesidades para mejorar las condiciones ambientales	PGN	\$0	\$0	\$0	\$0
Planear la distribución y ubicación de los puestos de trabajo	PGN	\$0	\$0	\$0	\$0
Adquirir dotación del inmueble	PGN	\$0	\$0	\$0	\$0
Efectuar traslado equipos y de funcionarios	PGN	\$0	\$0	\$0	\$0
Mantenimiento y operación (año 0)	PGN	\$0	\$0	\$0	\$0
Instalar la dotación institucional adquirida (equipos, redes y muebles)	PGN	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$0	\$0	\$0	\$0

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2014 - 2016

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2015-Jun	32.000.000.000	32.768.000.000	32.768.000.000	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 45,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/06/2015)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Ptal.
Recursos Propios	32.768.000.000	32.768.000.000	0	0	0	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	32.768.000.000	32.768.000.000	0	0	0	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	32.768.000.000	32.768.000.000	0	0	0	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

SPI detalle de proyecto

Julio, 17, 2015 10:06 a.m.

Proyecto: ADQUISICION SEDE PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. BOGOTÁ - 2813011000364

>> Evolución 2015

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	32.768.000,00 0	32.768.000,00 0	32.768.000,00 0	32.768.000,00 0	32.768.000,00 0	32.768.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	45,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestión	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Avance Plan De Accion	100	0,45	0,45 %
Observaciones: JUNIO: Con Decreto 1340 del 19 JUN 2015 el MHCP autorizó desplazamiento del presupuesto de inversión para adquisición de la sede. El 01 JUL 2015 se elaboró el CDP No. 34615 por \$32.768,0 millones para adquirir el nuevo edificio.			
Contratos suscritos	1	0,00	0,00 %

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Regional

	Por Regionalizar	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonia	Bogotá D.C.
Inversión	0	0	0	0	0	0	32.768.000,000
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Regionalización de Recursos



SPI detalle de proyecto

julio, 17, 2015 10:06 a.m.

Proyecto: ADQUISICION SEDE PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM., BOGOTA - 2013011000384

Fuente financiación / Departamento	Inicial	Vigente	Compromisos	Obligación	Pago
Recursos Propios	32.768.000.000	32.768.000.000	0	0	0
--Bogota	32.768.000.000	32.768.000.000	0	0	0
TOTAL	65.536.000.000	65.536.000.000	0	0	0

>> Regionalización de Productos

OBJETIVO ESPECIFICO
